


**Grafic lucrari finalizate
canalizare Roman**

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. Avram Iancu	100,00%	0,00%
2	Str. Petru Rares	100,00%	0,00%
3	Str. Nicolae Balcescu	100,00%	0,00%
4	Str. Dr. Ghelerter	100,00%	0,00%
5	Str. Aprodu Arbore	100,00%	0,00%
6	Str. Petrodava	100,00%	0,00%
7	Str. Fd. Crisan	100,00%	0,00%
8	Str. Bucovinei	100,00%	0,00%
9	Str. Islazului	100,00%	0,00%
10	Str. Ciocarliei	100,00%	0,00%
11	Str. Zimbrului	100,00%	0,00%
12	Str. Cornului	100,00%	0,00%
13	Str. Perisorului	100,00%	0,00%
14	Str. Tinosului	100,00%	0,00%
15	Str. Fd. Tinosului	100,00%	0,00%
16	Str. Marului	100,00%	0,00%
17	Str. Ocnitei	100,00%	0,00%
18	Str. Pescarilor	100,00%	0,00%
19	Str. Salciei	100,00%	0,00%
20	Str. Progresului	100,00%	0,00%
21	Str. Zebrei	100,00%	0,00%
22	Str. Prundului	100,00%	0,00%
23	Str. Caramidariei	100,00%	0,00%
24	Str. Canepii	100,00%	0,00%
25	Str. Zambilelor	100,00%	0,00%
26	Str. Lupeni	100,00%	0,00%
27	Str. Visinilor	100,00%	0,00%
28	Str. Cocorului	100,00%	0,00%
29	Str. Sarata	100,00%	0,00%
30	Str. Narciselor	100,00%	0,00%
31	Str. Primaverii	100,00%	0,00%
32	Str. Mihai Viteazu	100,00%	0,00%
33	Str. Fabricii	100,00%	0,00%
34	Str. Prof.Dumitru Martinas	100,00%	0,00%

Grafic lucrari finalizate canalizare Roman

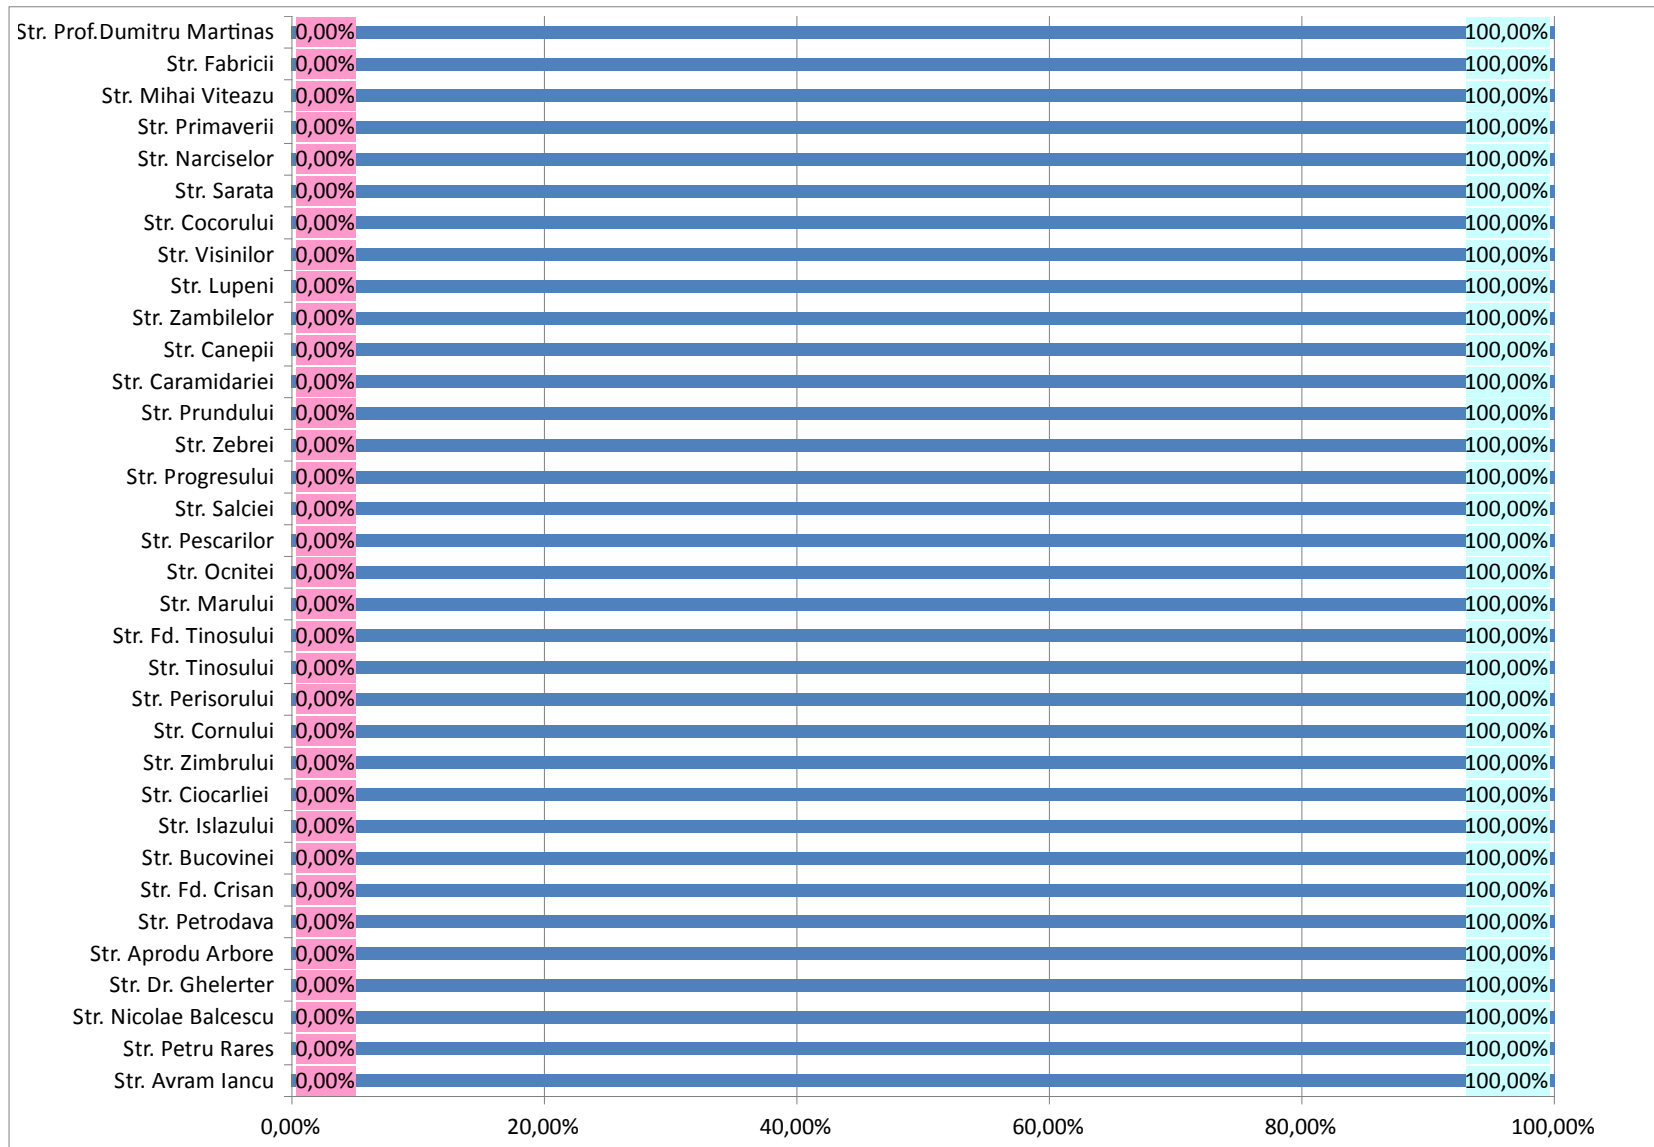

**Grafic lucrari finalizate
canalizare Sabaoani**

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. Luceafarului	100,00%	0,00%
2	Str. Postei	100,00%	0,00%
3	Str. Eternitatii	100,00%	0,00%
4	Str. Stejarului	100,00%	0,00%
5	Str. Artelor	100,00%	0,00%
6	Str. Sperantei	100,00%	0,00%
7	Str. Nucilor	100,00%	0,00%
8	Str. Progresului	100,00%	0,00%
9	Str. Arcului	100,00%	0,00%
10	Str. Viorelelor	100,00%	0,00%
11	Str. Busuiocului	100,00%	0,00%
12	Str. Castanilor	100,00%	0,00%
13	Str. Muncii	100,00%	0,00%
14	Str. Orizontului	100,00%	0,00%
15	Str. Privighetorii	100,00%	0,00%
16	Str. Ciocarliei	100,00%	0,00%
17	Str. Energiei	100,00%	0,00%
18	Str. Campului	100,00%	0,00%
19	Str. Trandafirilor	100,00%	0,00%
20	Str. Crizantemelor	100,00%	0,00%
21	Str. Ecoului	100,00%	0,00%
22	Str. Fd. Ciresilor	100,00%	0,00%
23	Str. Carpati	100,00%	0,00%
24	Str. Sportului	100,00%	0,00%
25	Str. Triumfului	100,00%	0,00%
26	Str. Popilor	100,00%	0,00%
27	Str. Crinilor	100,00%	0,00%
28	Str. Bradului	100,00%	0,00%
29	Str. Primaverii	100,00%	0,00%

Grafic lucrari finalizate canalizare Sabaoani

